

СИТУАЦИЯ

ПРИМЕРЕН СТРОИТЕЛНО - СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

М 1 : 500

- Обектът се изгражда по традиционен начин. При изпълнението на изкопните, кофражните, арматурните и бетонните работи е необходимо да се спазват стриктно изискванията на всички нормативни документи, действащи в момента, а също и мерките за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, приложени към записката.
- На добре видимите места, съгласувани с координатора по БЗ да се окачат инструкции по видове СМР, изработени от Строителя за безопасното им извършване.

Координаторът по БЗ ще бъде отговорен да изисква:

- Зоната на обслужване на стрелата на автокрана е зона с ограничен достъп, която се означава със знаци "Забранен достъп на външни лица".
- По време на бетонирането задължително да се следи за състоянието на кофража. При установяване на нередности процесът на полагане на бетона незабавно да се спре до привеждане на товаросимостта на кофража към проектната.
- Бетонирането да се преустанови при неблагоприятни климатични условия, като гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление.

4. Координаторът по БЗ ще бъде отговорен да изисква и постоянно да наблюдава и проверява за наличието на табели по чл. 65/2/ от Наредба N 2, поставени на съответните места, а също и:

- Табела: "Внимание! Вход-Изход строителен обект!"
- Предупреждаващ знак: "Опасност от електрически ток!"



При авария позвъни на: 1.Единен номер за спешни повиквания Телефон: 112
2.Бърза помощ Телефон: 150

- "Внимание опасност от падащи предмети и товари!"
- "Внимание опасност от пожар!"

-Задължаващ знак:
"Трябва да се носи"


предпазна каска и предпазни ботуши!"

-Указателен знак:
"Пожарогасител"



-Допълнителен информационни знаци: "Забранено пушенето в района на обекта!"
- "Телефон !" !


ВРЕМЕННА ПРИОБЕКТОВА ПЛОЩАДКА

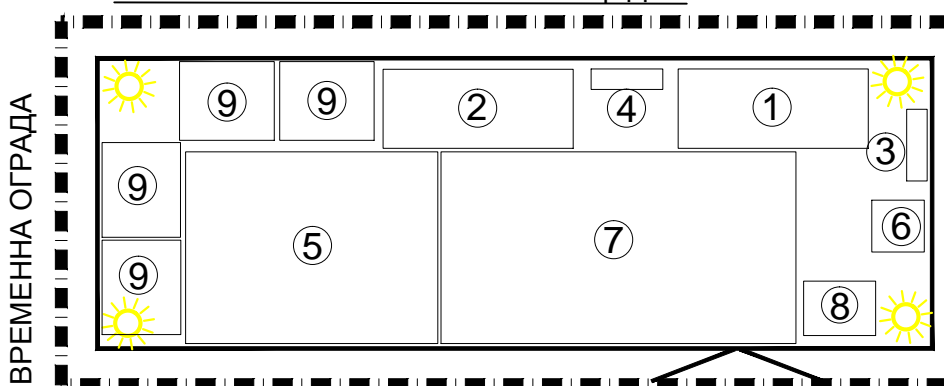

ВХОД / ИЗХОД

ЛЕГЕНДА:

- 1 ФУРГОН ТЕХН. РЪКОВОДИТЕЛ, ОБОРУДВАНС АПТЕЧКА И МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
- 2 ФУРГОНИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ
- 3 ЕЛ. ТАБЛО
- 4 ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО
- 5 ОТКРИТ СКЛАД
- 6 ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА
- 7 МЯСТО ЗА ДОМУВАНЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА
- 8 ОХРАНА
- 9 КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
- с вместимост - 4 куб.м
- ОСВЕТЛЕНИЕ



СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ :	инж. Нели Грънчарова	
<div>София ул. Ралевица 96 бл.2 e-mail: nellyg@abv.bg GSM: 0898 556 830</div> Вик мрежи, съоръжения и инсталации		
	ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС
ВОДЕЩ ПРОЕКТ	инж. Нели Грънчарова	
ПРОЕКТАНТ	инж. Мария Бучкова	
УПРАВИТЕЛ	инж. Нели Грънчарова	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	СТОЛИЧНА ОБЩИНА р-н "Нови Искър"	ДОГОВОР No
ОБЕКТ 1	Уличен канал за битови води - кл. 326, кл. 325 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, , р-н "Нови Искър"	ЧАСТ ПБЗ
ОБЕКТ 2	Уличен водопровод - кл.- 187 - по ул. „Царевец“ от ул. „Светлина“ ОТ897 до ул. „Стадион“ с ОТ622, м. гр. Нови Искър, р-н "Нови Искър"	
ЧЕРТЕЖ	ПРИМЕРЕН СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН	ФАЗА РП
FILENAME		М 1:500
РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	ЧЕРТЕЖ No
1 2 3 4 5 6 7 8	11.2016г.	1
